


**Legende**

- offene Bauweise
- Kabeleinzug
- Gebaut

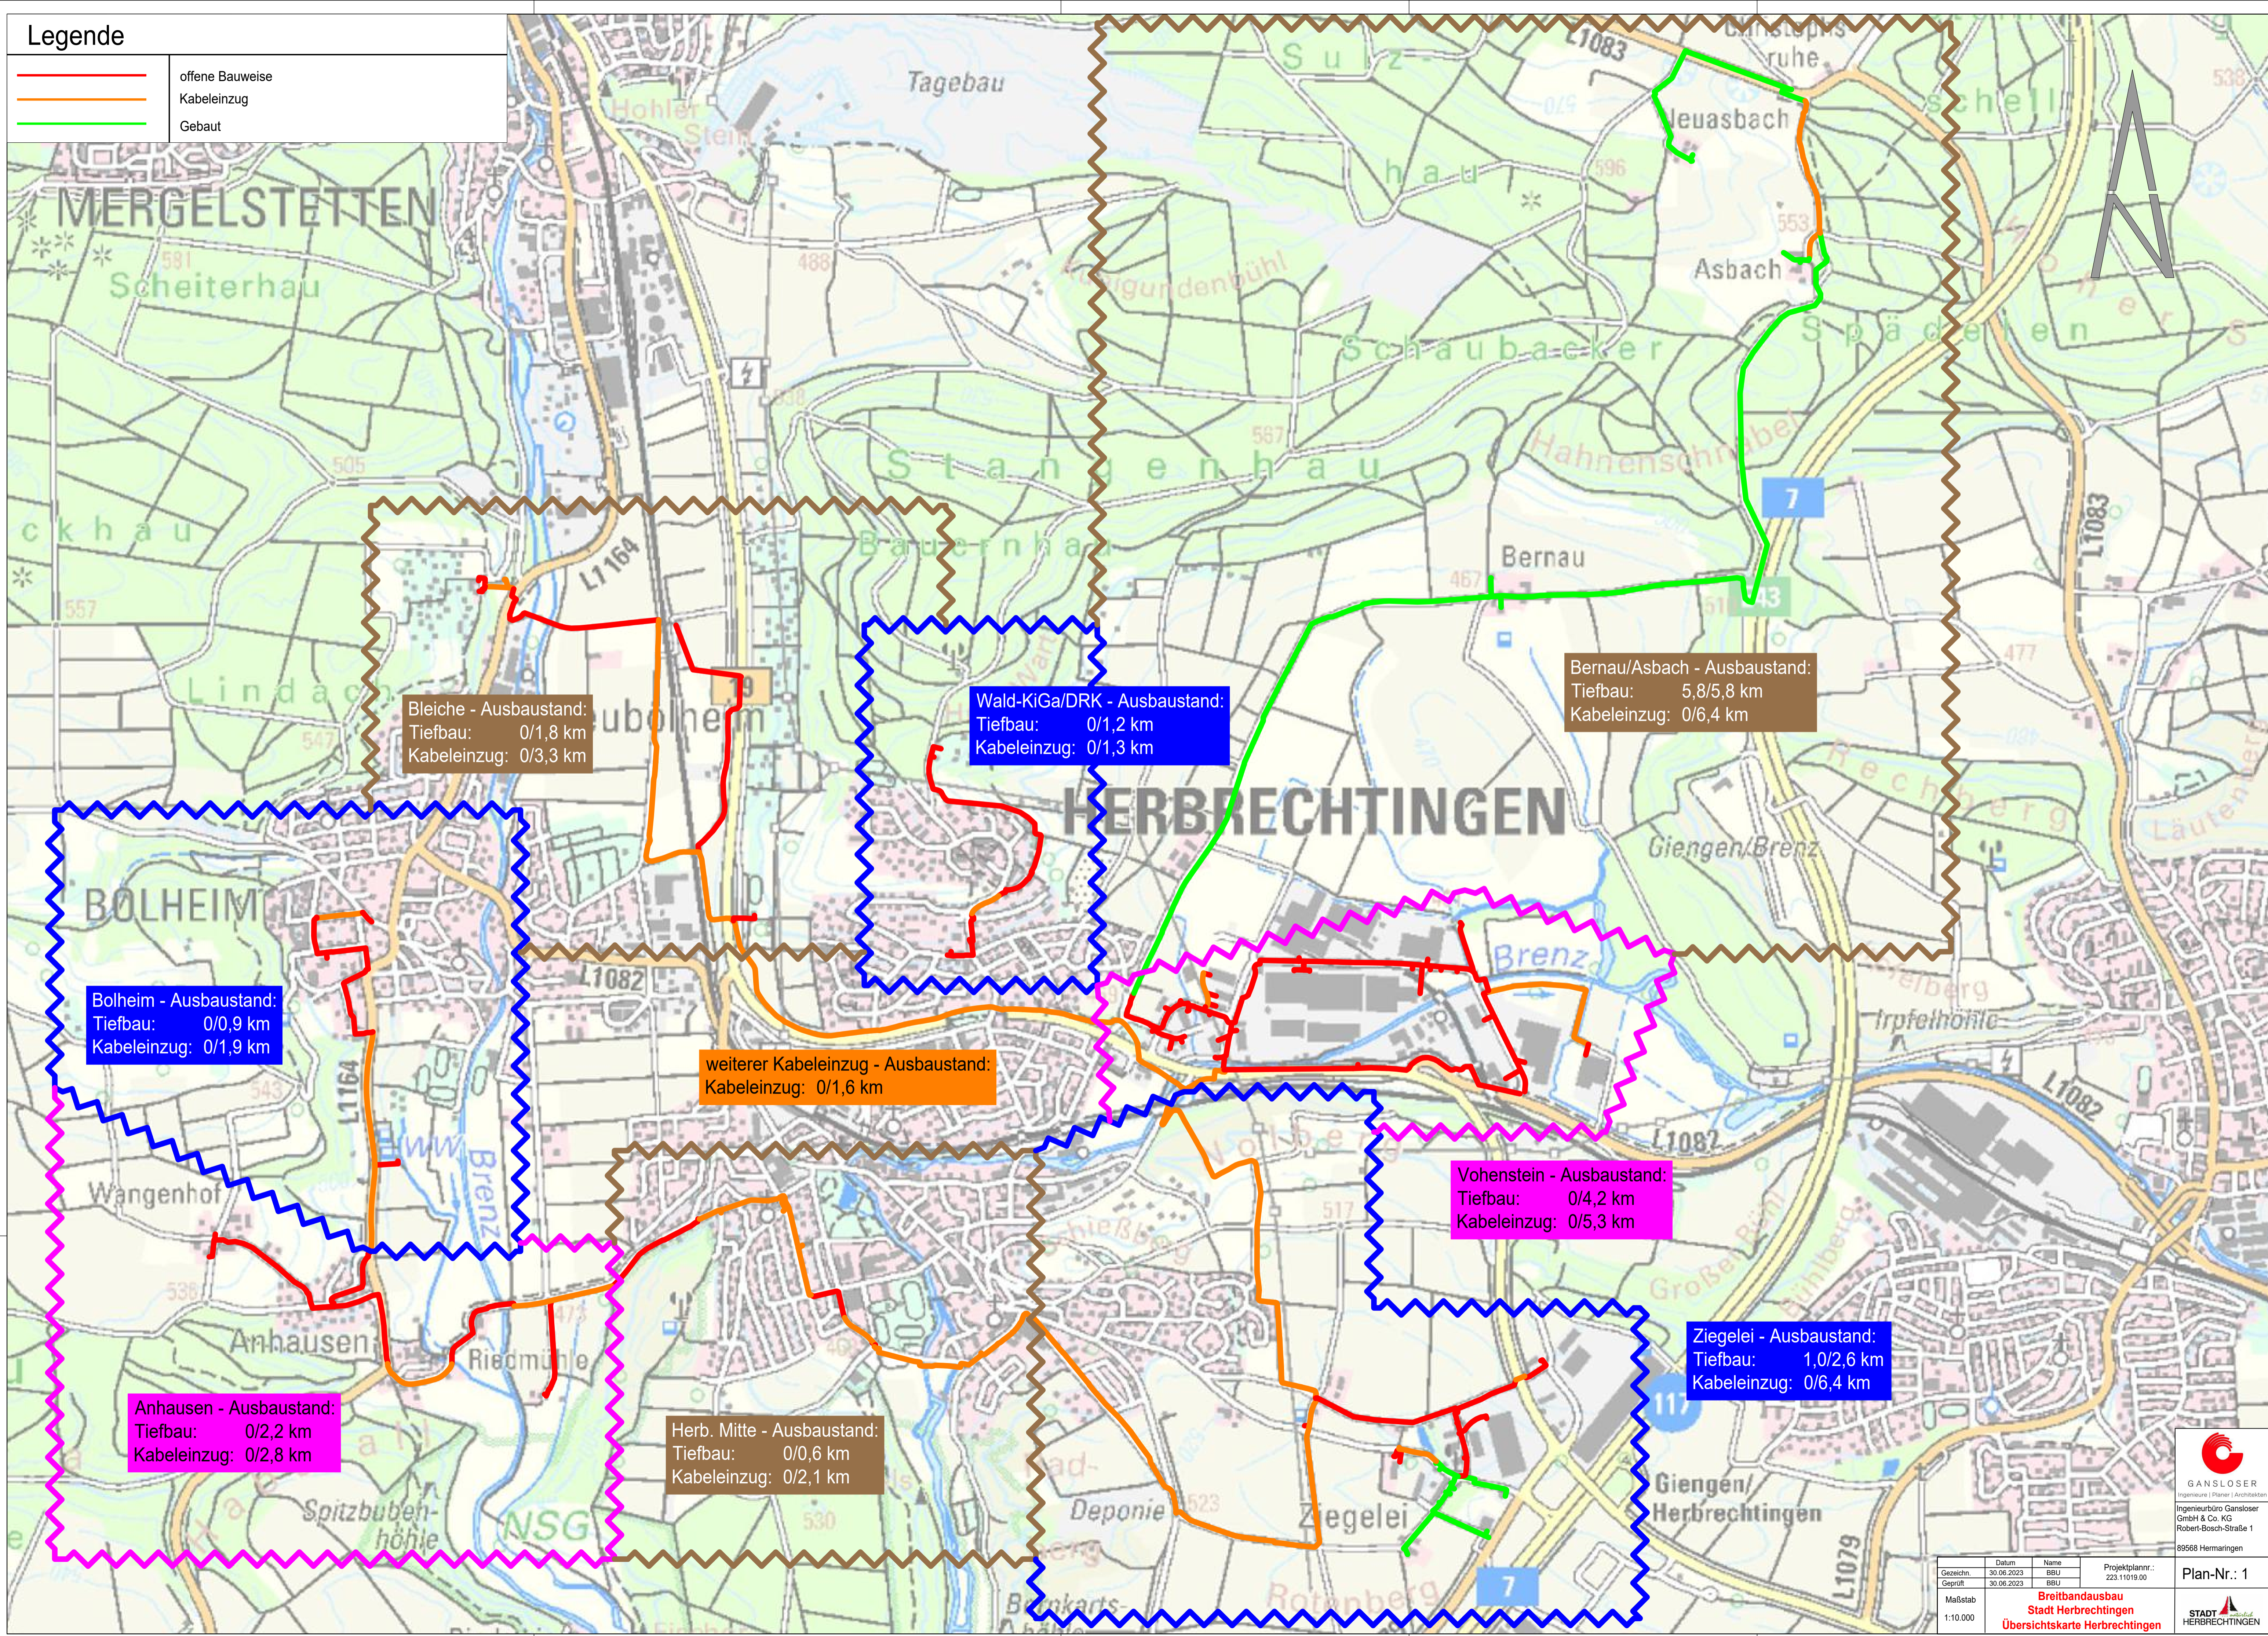

Bleiche - Ausbaustand:  
Tiefbau: 0/1,8 km  
Kabeleinzug: 0/3,3 km

Wald-KiGa/DRK - Ausbaustand:  
Tiefbau: 0/1,2 km  
Kabeleinzug: 0/1,3 km

Bernau/Asbach - Ausbaustand:  
Tiefbau: 5,8/5,8 km  
Kabeleinzug: 0/6,4 km

Bolheim - Ausbaustand:  
Tiefbau: 0/0,9 km  
Kabeleinzug: 0/1,9 km

weiterer Kabeleinzug - Ausbaustand:  
Kabeleinzug: 0/1,6 km

Vohenstein - Ausbaustand:  
Tiefbau: 0/4,2 km  
Kabeleinzug: 0/5,3 km

Anhausen - Ausbaustand:  
Tiefbau: 0/2,2 km  
Kabeleinzug: 0/2,8 km

Herb. Mitte - Ausbaustand:  
Tiefbau: 0/0,6 km  
Kabeleinzug: 0/2,1 km

Ziegelei - Ausbaustand:  
Tiefbau: 1,0/2,6 km  
Kabeleinzug: 0/6,4 km

Gezeichnet 30.06.2023	Datum	Name	Projektplan-Nr.: 223.11019.00	Plan-Nr.: 1
	Geprüft 30.06.2023	BBU		
Maßstab 1:10.000		Breitbandausbau Stadt Herbrectingen Übersichtskarte Herbrectingen		 <small>GANSLÖSER Ingenieurbüro Ganslöser GmbH &amp; Co. KG Robert-Bosch-Straße 1 89568 Hermingen</small> <small>STADT HERBRECHTINGEN</small>
